Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1		Projektbeginn	1034 Tage	Mo 04.01.16	Do 19.12.19
2		**Deputation, Mittelbereitstellung**	**1 Tag?**	**Mo 04.01.16**	**Mo 04.01.16**
3		Mittel stehen bereit			
4		**Leitungskoordination**	**43 Tage**	**Mi 18.11.15**	**Fr 15.01.16**
8		**Verkehrskoordination**	**197 Tage**	**Mi 01.07.15**	**Do 31.03.16**
9		Verkehrskoordination nach Bestandsaufnahme des Umfanges der Leitungsverlegungen	197 Tage	Mi 01.07.15	Do 31.03.16
10		Verkehrskoordination BSAG/ASV/Polizei	1 Tag	Do 07.01.16	Do 07.01.16
11		Verkehrskoordination Verkehrskonzept	1 Tag	Mo 08.02.16	Mo 08.02.16
12		**Landschaftspflegerische Begleitplanung (20-5)**	**215 Tage**	**Mo 06.07.15**	**Sa 30.04.16**
13		LBP fertigstellen	171 Tage	Mo 06.07.15	Mo 29.02.16
14		Befreiungsantrag restliche Bäume	45 Tage	Di 01.03.16	Sa 30.04.16
15		**Baumschutz, Wurzelschutz, Rodungen, Rückbau div. Gegenstände**	**242 Tage**	**Mi 13.01.16**	**Do 15.12.16**
16		vorlaufende Rodungsarbeiten	4 Tage	Mi 13.01.16	Mo 18.01.16
17		restliche Rodungsarbeiten	9 Tage	Mo 05.12.16	Do 15.12.16
18		Rückbau Anker, Gießpfanne, Bänke usw.	3 Tage	Fr 15.01.16	Di 19.01.16
19		Rückbau des steinernden Widder "Sir Charles"	5 Tage	Mo 31.10.16	Fr 04.11.16
20		**Ausführungsplanungen (20-14)**	**171 Tage**	**Do 06.08.15**	**Do 31.03.16**
21		Ausführungs- und Deckenhöhenplanung mit Unterschriften fertig stellen	1 Tag	Do 06.08.15	Do 06.08.15
22		Ausführungs- und Deckenhöhenplanung, einschl Leerrohrplanung BSAG und ASV 31 überarbeiten	25 Tage	Mo 14.12.15	Fr 15.01.16
23		Vertrag schliessen zur Anmietung der pro. Buswendeanlage	64 Tage	Mo 04.01.16	Do 31.03.16
24		Schriftliche Freigabe für Rückbau von Gleis und Gleisunterstützung auf dem Gelände der ehemaligen Bremer Wollkämmerei, einschl. Freigabe für den Umbau bezüglich der geänderten Signalgeber	41 Tage	Mo 04.01.16	Mo 29.02.16
25		Baurecht bzw. Betretungserlaubnis für Flurstück 39 zur Anlage einer geplanten Bautreppe	41 Tage	Mo 04.01.16	Mo 29.02.16
26		Schriftliche Freigabe zur Überbauung des Brückenbauwerkes über die Blumenthaler Aue aufgrund der geplanten Anlage einer Wegeverbindung	64 Tage	Mo 04.01.16	Do 31.03.16
27		**Wirtschaftsförderung Bremen**	**499 Tage**	**Mo 04.01.16**	**Do 30.11.17**
28		Vertrag schliessen zur Anmietung der pro. Buswendeanlage	64 Tage	Mo 04.01.16	Do 31.03.16
29		Übernahme der Fläche pro. Buswendeanlage vor Ort mit Vertretern ASV und SV Gewerbe	349 Tage	Mo 01.08.16	Do 30.11.17
30		Rückgabe der Fläche pro. Buswendeanlage vor Ort mit Vertretern ASV und SV Gewerbe	1 Tag	Do 30.11.17	Do 30.11.17
31		**Betriebsplan fertigstellen (32-8)**	**190 Tage**	**Mo 14.09.15**	**Fr 03.06.16**
32		Betriebsplanung erstellen	73 Tage	Mo 14.09.15	Mi 23.12.15
33		Ausschreibung der Großbeschilderung fertigen	16 Tage	Fr 13.05.16	Fr 03.06.16
34		**Wegweisende Großbeschilderung (32-8)**	**156 Tage**	**Mi 15.03.17**	**Mi 18.10.17**
35		Wegweisende Großbeschilderung gemäß Betriebsplan, einschließlich Fundamente fertigen und aufstellen	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
36		**Betriebsplan genehmigen (30-12)**	**219 Tage**	**Fr 29.01.16**	**Mi 30.11.16**
37		Betriebsplan abstimmen und genehmigen	219 Tage	Fr 29.01.16	Mi 30.11.16
38		Betriebsplan wird der Ausschreibung Straßenbau beigefügt und wird somit Vertragsbestandteil	55 Tage	Mo 23.05.16	Fr 05.08.16
39		**Ing.-Büro Bauüberwachung**	**269 Tage**	**Fr 04.11.16**	**Mi 15.11.17**
40		Ing.-Büro auffordern	1 Tag	Fr 04.11.16	Fr 04.11.16
41		Angebotsabgabe	1 Tag	Mi 30.11.16	Mi 30.11.16
42		AG Prüfung der Angebote	1 Tag	Fr 16.12.16	Fr 16.12.16
43		Ing.-Büro Auftragserteilung	1 Tag	Fr 13.01.17	Fr 13.01.17
44		1. Baubesprechnung: Anlaufbesprechung mit allen Beteiligten zum Baubeginn am 15.03.2017	1 Tag	Mi 08.02.17	Mi 08.02.17
45		Ing.-Büro Koordination Straßenbauarbeiten, einschl. Abnahme. Anschließend Abrechnung der Maßnahme	176 Tage	Mi 15.03.17	Mi 15.11.17
46		**Straßenbau: Vorlaufende Arbeiten**	**20 Tage**	**Mo 01.08.16**	**Fr 26.08.16**
47		Vorlaufende Arbeiten Erd- und Straßenbau im Bereich der neuen Umsteigeanlage Blumenthal	20 Tage	Mo 01.08.16	Fr 26.08.16
48		Erdarbeiten Lüssumer Straße gegenüber Fresenberg Straße zur FVE Eisenbahn laufend	9 Tage	Mo 01.08.16	Do 11.08.16
49		Erdarbeiten Flurstück 94/12 Lüder-Clüver Straße / Ecke Landrat-Christians Straße	11 Tage	Fr 12.08.16	Fr 26.08.16
50		**Straßenbau: Vorlaufende Arbeiten Erd- und Straßenbau pro. Busbahnhof**	**42 Tage**	**Mo 15.08.16**	**Di 11.10.16**
51		Umleitungsstrecke: Rückbau von Bordsteinanlagen in Kurvenbereichen der Nicolas-H. Schilling Straße/Zum Krempel und Marschgraben und Herstellung von Provisorien. Einschl. Markierungsarbeiten.	17 Tage	Mo 15.08.16	Di 06.09.16
52		Anlage einer Wegeverbindugn vom prov. Busbahnhof zur Landrat-Christians Straße herstellen	25 Tage	Mo 29.08.16	Fr 30.09.16
53		Markierung eines vorübergehenden BSAG Bushaltepunktes gemäß Betriebsplan	6 Tage	Di 04.10.16	Di 11.10.16
54		**Straßenbau: Umgestaltung Busbahnhof**	**238 Tage**	**Mi 18.01.17**	**Fr 15.12.17**
55		BSAG Betrieb zusätzlicher Busverkehr auf der Landrat-Christian Straße von Mittwoch, den 15.03.2017 bis einschl. Samstag, den 18.03.2017. Zusätzliche verkehrsrechtliche Genehmigung stellen	4 Tage	Mi 15.03.17	Sa 18.03.17
56		Prov. Zuwegung vom prov. Busbahnhof über die Landrat-Christians Straße zum Parkplatz der FVE herstellen und während der Bauzeit mehrfach verlegen, unterhalten, versetzen	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
57		Prov. Zufahrt (zum Bauhof) ab der Gleisanlage in der Landrat-Christians-Straße zum alten BhF. Blumentahl Nr. 86 herstellen und während der Bauzeit mehrfach verlegen, unterhalten, versetzen	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
58		Prov. Zufahrt bzw.Herstellen eines Provisoriums zur Landrat-Christians Straße 73 (Pumpwerk hanseWasser) und während der Bauzeit mehrfach verlegen, unterhalten, versetzen	88 Tage	Mi 15.03.17	Fr 14.07.17
59		Verkehrsanordnung für die prov. Buswendeschleife erstellen, einreichen und die in Verantwortung übernehmen	194 Tage	Mi 18.01.17	Mo 16.10.17
60		Bürocontainer des AG aufstellen und vorhalten	217 Tage	Do 16.02.17	Fr 15.12.17
61		BA 1a Straßenbauarbeiten Umgestaltung Busbahnhof einschl. Landrat-Christian-Straße unter Vollsperrung. BW 557 Auebrücke vor Beschädigungen schützen. BSAG Betrieb, zusätzlicher Busverkehr auf der Landrat-Christian Straße. Siehe Baubeschreibung.	88 Tage	Mi 15.03.17	Fr 14.07.17
62		BA 1a Herstellen eines Provisoriums von Einmündung Fresenbergstraße bis Lüder Klüver Straße. Fresenbergstraße gesperrt	10 Tage	Mi 15.03.17	Di 28.03.17
63		BA 1b Erweiterungdes BA 1a zur Lüssumer Straße nach Inselrückbau. Umbau am 29.03.2017 ab 09:00 Uhr. Fresenbergstraße ab 30.03.2017 frei.	78 Tage	Mi 29.03.17	Fr 14.07.17
64		BA 2 Vollsperrung Lüssumer Straße von der Fresenbergstraße bis Gleisanlage FVG	45 Tage	Mo 15.05.17	Fr 14.07.17
65		BA 2a Vollsperrungserweiterung Lüssumer Straße von der Fresenbergstraße bis 20 m über die Gleisanlage FVG	6 Tage	Fr 07.07.17	Fr 14.07.17
66		Umbau für den BA 3 am Samstag, den 15.07.2017. AB 12:00 Uhr ist der IV über die Buswendeanlage zu führen. Anschließend Restumbau.	1 Tag	Sa 15.07.17	Sa 15.07.17
67		BA 3 Vollsperrung Lüssumer Straße ab/einschl. Fresenbergstraße und Vollsperrung Knotenpunkt Lüssumer Straße/Landrat-Christians Straße bis Haus Nr. 94/79. Überfahrt über Busbahnhof	55 Tage	Mo 17.07.17	Fr 29.09.17
68		BA 4 Vollsperrung Knotenpunkt Lüssumer Straße / Fresenbergstraße ab Freitag um 18:00 Uhr bis Mittwoch um 04:00 Uhr	4 Tage	Fr 29.09.17	Mi 04.10.17
69		BA 5 Vollsperrung Umsteigeanlage Blumenthal. Rückbau der Provisorien. Rückbau der kompletten Verkehrsicherung am 18.10.2017.	11 Tage	Mi 04.10.17	Mi 18.10.17
70		BA 6 Umleitungsstrecke: Rückbau der Provisorien in den Kurvenbereichen der Nicolas-H. Schilling Straße/Zum Krempel und Marschgraben	20 Tage	Do 19.10.17	Mi 15.11.17
71		Markierung auf prov. Buswendeschleife BWK-Gelände entfernen	2 Tage	Mo 23.10.17	Di 24.10.17
72		Provisorien auf prov. Buswendeschleife BWK-Gelände entfernen	10 Tage	Mo 23.10.17	Fr 03.11.17
73		**Brückenbau**	**638 Tage**	**Mo 11.05.15**	**Mi 18.10.17**
74		BW 557 Auebrücke mit Stützwand verbreitern, einschl. Geländer (Baumaßnahme ist fertiggestellt)	75 Tage	Mo 11.05.15	Fr 21.08.15
75		BW 557 Auebrücke vor Beschädigungen schützen (AN Straßenbau führt die Arbeiten aus)	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
76		BW 557 Auebrücke Sanierung Fugenerneuerung zwischen Schlepplatte und Brückenüberbau. AN Straßenbau führt die Arbeiten aus.	5 Tage	Mi 03.05.17	Di 09.05.17
77		**hanseWasser**	**9 Tage**	**Mo 17.04.17**	**Do 27.04.17**
78		Landrat-Christian Straße: Schacht prüfen und Konus drehen. (AN Straßenbau führt die Arbeiten aus)	9 Tage	Mo 17.04.17	Do 27.04.17
79		**Lichtsignalanlagen**	**522 Tage**	**Mi 02.12.15**	**Do 30.11.17**
80		Mittelbereitstellung zur Planung des Überganges der Farge-Vegesacker-Eisenbahn	8 Tage	Mi 02.12.15	Fr 11.12.15
81		Leerrohrverlegung ohne Kabelverlegung in den Nebenflächen Lüssumer Straße bis zur Landrat-Christians Straße Nr. 94. Die Arbeiten sind vorab mit den Arbeiten der wesernetz Bremen durchzuführen	82 Tage	Mo 25.07.16	Di 15.11.16
82		Einmündung Landrat-Christians-Straße / Einmündung Nicolaus-H.-Schilling Straße pro. LSA aufstellen, vorhalten und entfernen. Einschl. Ansteuerung für ÖPNV ermöglichen	164 Tage	Do 02.03.17	Di 17.10.17
83		Knotenpunkt Zur Westpier/Wohldstraße/Landrat-Chris Straße. Ansteuerung ÖPNV einrichten	164 Tage	Do 02.03.17	Di 17.10.17
84		LSA Knotenpunkt Landrat-Christian Straße / Lüssumer Straße: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten	194 Tage	Mo 06.03.17	Do 30.11.17
85		LSA Knotenpunkt Landrat-Christian Straße / Einfahrt in die Buswendeanlage: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten	172 Tage	Mo 06.03.17	Di 31.10.17
86		LSA Knotenpunkt Lüssumer Str./Fresenbergstr./Ausfahrt aus der Buswendeschleife: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflä. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten	172 Tage	Mo 06.03.17	Di 31.10.17
87		BÜ-Sicherungsanlagen Landrat-Christian Straße anpassen	80 Tage	Mi 15.03.17	Di 04.07.17
88		Umbauanpasung der vorlaufenden Signalgeber für die Gleisverbindung der ehemaligen Bremer Wollkämmerei einschl. Leerrohrverbindung zum Standort des Signalgebers. Alte Signalgeber entfernen	80 Tage	Mi 15.03.17	Di 04.07.17
89		**Farge-Vegesacker-Eisenbahn**	**481 Tage?**	**Mi 02.12.15**	**Mi 04.10.17**
90		Mittelbereitstellung zur Planung des Überganges der Farge-Vegesacker-Eisenbahn der FGE durch ASV 31 bereitstellen	8 Tage	Mi 02.12.15	Fr 11.12.15
91		Abstimmung mit Eisenbahnaufsicht durch Farge-Vegesacker-Eisenbahn	41 Tage	Fr 04.12.15	Fr 29.01.16
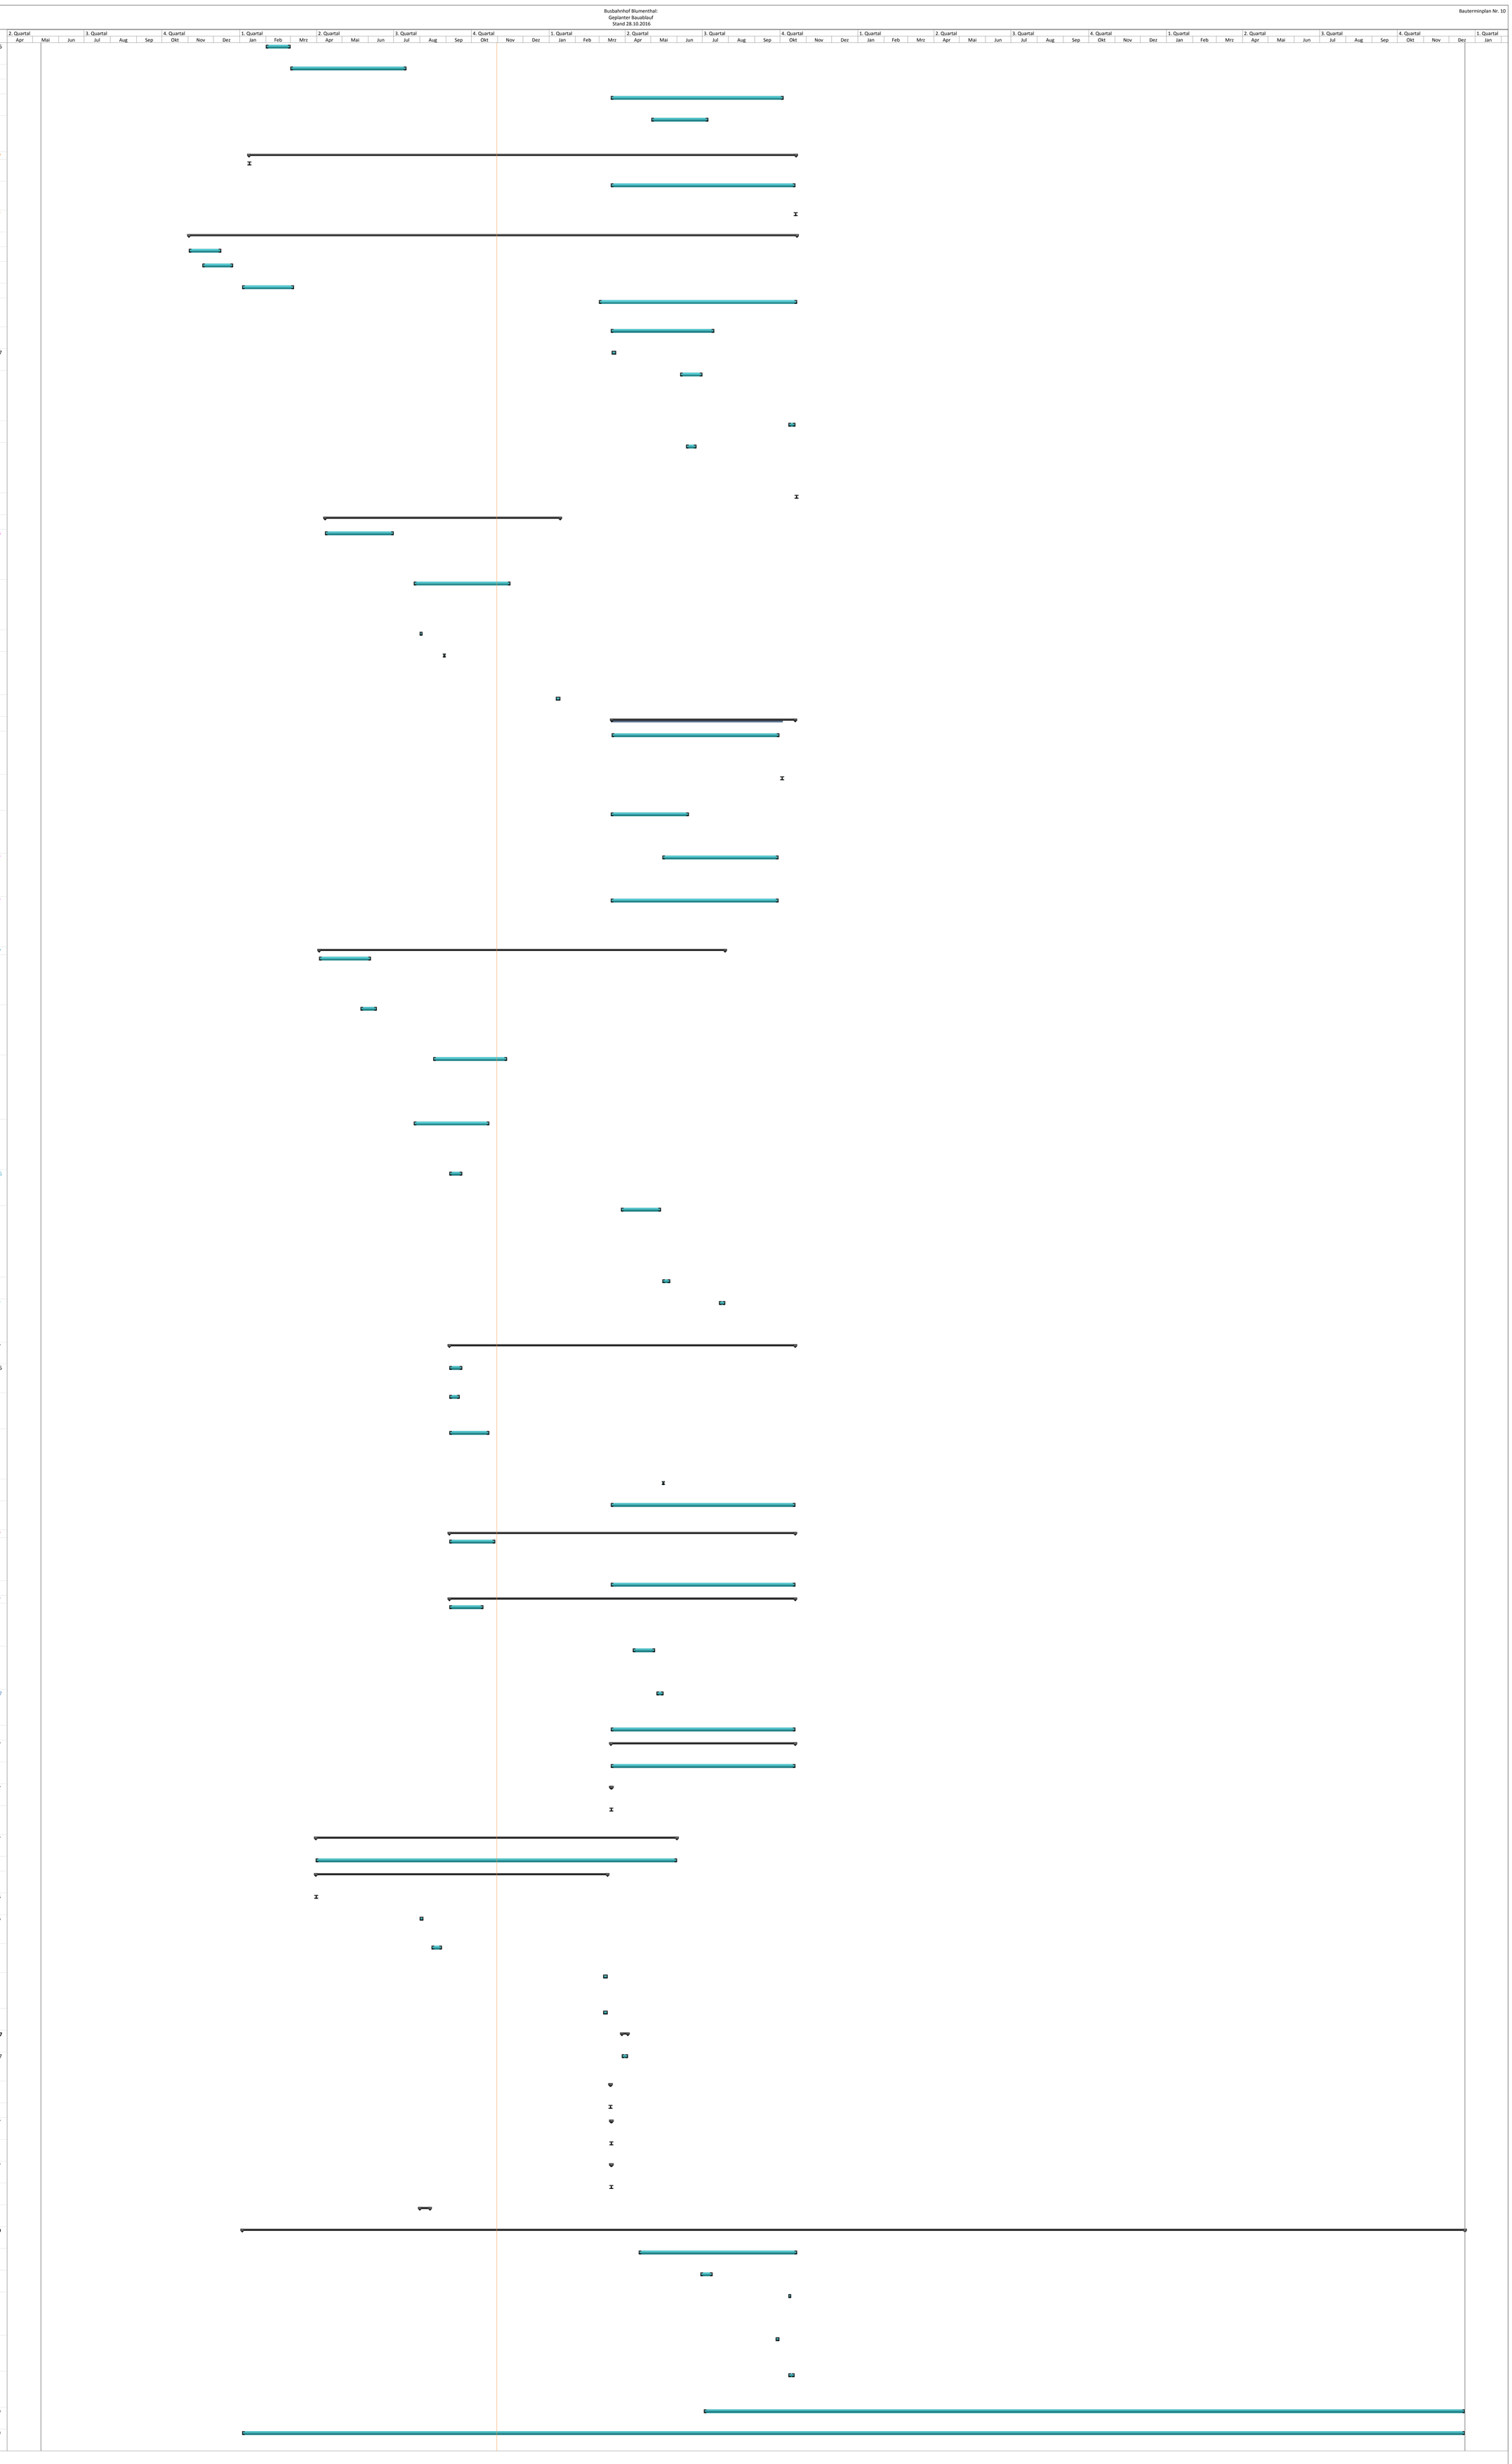
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
92	PT1 beauftragen	21 Tage	Mo 01.02.16	Mo 29.02.16
93	Planung durch Eisenbahnaufsicht genehmigt	99 Tage	Di 01.03.16	Fr 15.07.16
94	BÜ-Sicherungsanlagen Lüssumer Straße anpassen			
95	ggf. Sicherheitsposten stellen	146 Tage	Mi 15.03.17	Mi 04.10.17
96	Vorlaufende Lichtzeichen einseitig anpassen. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen der Lüssumer Straße	49 Tage	Di 02.05.17	Fr 07.07.17
97	BSAG Betrieb	463 Tage	Di 12.01.16	Do 19.10.17
98	Termin über Ausführung/Herstellung der prov. Buswendeschleife	1 Tag	Di 12.01.16	Di 12.01.16
99	Busverkehr fahren auf prov. Buswendeschleife BWK-Gelände ab Dienstbeginn 15.03.2017 bis Dienstende am 18.10.2017	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
100	Neue Umsteigeanlage Blumenthal in Betrieb nehmen, ab Dienstbeginn am 19.10.2017	1 Tag	Do 19.10.17	Do 19.10.17
101	**BSAG Leitungsbau und Fahrgastunterstände**	**515 Tage**	**Mo 02.11.15**	**Fr 20.10.17**
102	Ausschreibung zur Leerrohrverlegung liefern	28 Tage	Mo 02.11.15	Mi 09.12.15
103	Leitungsplan BSAG überarbeiten und an ASV zur weiteren Bearbeitung liefern	26 Tage	Mi 18.11.15	Mi 23.12.15
104	Planunterlagen für den prov. Wendeschleife erstellen	45 Tage	Mo 04.01.16	Fr 04.03.16
105	5 Stück prov. Fahrgastunterstände in der prov. Wendeschleife BWK-Gelände aufstellen + vorhalten	168 Tage	Mi 01.03.17	Fr 20.10.17
106	Rohr- und Kabelverlegearbeiten gemäß Leitungsplan. AN des ASV führt die Arbeiten aus.	88 Tage	Mi 15.03.17	Fr 14.07.17
107	Vorhandene Fahrgastunterstände am Busbahnhof Blumenthal abbauen	3 Tage	Do 16.03.17	Mo 20.03.17
108	Aufstellen (9 Stück) der neuen Fahrgastunterstande in der Buswendeanlage Blumenthal, einschl. Fundamente, Kabelverlegearbeiten im Bereich der Unterstände und Anschlussarbeiten	20 Tage	Mo 05.06.17	Fr 30.06.17
109	Scheibeneinbau in FGU	6 Tage	Mi 11.10.17	Mi 18.10.17
110	Aufstellen von 2 Stück Werbeträger in der Buswendeanlage Blumenthal, einschl. Fundamente, Kabelverlegearbeiten im Bereich der Unterstände und Anschlussarbeiten	10 Tage	Mo 12.06.17	Fr 23.06.17
111	5 Stück prov. Fahrgastunterstände in der prov. Wendeschleife BWK-Gelände abbauen	1 Tag	Fr 20.10.17	Fr 20.10.17
112	**Öffentliche Beleuchtung Vorlaufende Leitungsverlegung**	**200 Tage**	**Mo 11.04.16**	**Fr 13.01.17**
113	Leerrohrverlegung ohne Beleuchtungsmaste setzen in den Nebenflächen Landrat-Christians Straße Nr. 81 bis gegenüber Nr. 82 (Gleisanlage). Die Arbeiten sind vorab mit den Arbeiten der wesernetz Bremen durchzuführen	59 Tage	Mo 11.04.16	Do 30.06.16
114	Leerrohrverlegung ohne Beleuchtungsmaste setzen in den Nebenflächen Lüssumer Straße bis zur Landrat-Christians Straße Nr. 94. Die Arbeiten sind vorab mit den Arbeiten der wesernetz Bremen durchzuführen	82 Tage	Mo 25.07.16	Di 15.11.16
115	3 Stück Beleuchtungsmasten im Bereich der Umleitungsstrecke zurücksetzen	3 Tage	Mo 01.08.16	Mi 03.08.16
116	Kabelverlegungsarbeiten (AN des ASV Straßenbau führt aus) und Beleuchtungsmaste setzen in der Wegeverbindung Landrat-Christians Straße prov. Busbahnhof	2 Tage	Mo 29.08.16	Di 30.08.16
117	Pro. Beleuchtung auf dem prov. Busbahnhof an vorhanden Masten anbringen	5 Tage	Mo 09.01.17	Fr 13.01.17
118	Öffentliche Beleuchtung: Umgestaltung Busbahnhof	155 Tage	Do 16.03.17	Mi 18.10.17
119	Prov. Beleuchtungsanlage einschl. Poller und Luftverkabelung auf vorrübergehende Wegeverbindung zur Vegesacker Eisenbahn vom prov. Busbahnhof herstellen, vorhalten, umsetzen	142 Tage	Do 16.03.17	Fr 29.09.17
120	Prov. Masten einschl. Poller auf der vorrübergehende Wegeverbindung demontieren und entfernen. Einschl. Luftverkabelung.	1 Tag	Di 03.10.17	Di 03.10.17
121	Kabelverlegungsarbeiten und Beleuchtungsmaste im Bereich des neuen Busbahnhofes Blumenthal, einschl. der Nebenflächen zur Grünanlage und zum BW 557	66 Tage	Mi 15.03.17	Mi 14.06.17
122	Kabelverlegungsarbeiten und Beleuchtungsmaste setzen in den Nebenflächen der Lüssumer Straße ab der Gleisanlage bis Landrat-Christians Straße Nr. 94 bis gegenüber Nr. 82 (Gleisanlage)	99 Tage	Mo 15.05.17	Do 28.09.17
123	Kabelverlegungsarbeiten im vorhanden Rohrsystem und Beleuchtungsmaste setzen in den Nebenflächen Landrat-Christians Straße Nr. 82 (Gleisanlage) bis Lüssumer Straße gegenüber Nr. 5 an die Gleisanlage	142 Tage	Mi 15.03.17	Do 28.09.17
124	**wesernetz Bremen GmbH**	**344 Tage**	**Mo 04.04.16**	**Do 27.07.17**
125	Verlegung von einem Steuerkabel, einem 10 kV-Kabel und Erneuerung von zwei 10 kv-Kabeln in den Nebenflächen der Landrat-Christians-Straße von Haus-Nr. 81 bis zu den Gleisanlagen der WfG	45 Tage	Mo 04.04.16	Fr 03.06.16
126	Landrat-Christians-Straße im Bereich Haus Nr Nr. 73b / 74a Schieberkreuz aus der zukünftigen Fahrbahn in die Nebenanlagen setzen, einschl.ca. 50 m Wasserleitung erneuern	15 Tage	Mo 23.05.16	Fr 10.06.16
127	Lüder-Clüver-Straße/Lüssumer Straße/Landrat-Christian Straße. Anpassen von Verteilerschränken (Steuerkabelschrank und Stromverteiler) Kabelverlegung 10 kV, 1 kV, Steuerkabel und Gasleitung in die neuen Nebenflächen des Grundstückes 94/12	63 Tage	Mi 17.08.16	Fr 11.11.16
128	Kabelverlegung in offener Bauweise div. Leitungen neu ordnen. In der Lüssumer Straße Seite AOK Bremen zur Landrat-Christians Straße 94 in den Nebenflächen div. Leitungen neu ordnen	65 Tage	Mo 25.07.16	Fr 21.10.16
129	Lüssumer Straße zwischen Zufahrt zum neuen Busbahnhof und dem Parkplatz FGE, anpassen eines Verteilerschrankes im Bereich der östlichen Nebenflächen	11 Tage	Mo 05.09.16	Mo 19.09.16
130	DN 300 Stahlgasleitung in der Landrat-Christians-Straße von der Lüssumer Straße bis Landrat-Christians-Straße Hausnummer 82 in die zukünftigen Nebenflächen, einschl. Anschluß- bzw. Umschlußarbeiten an die Altleitung. BW 557 Auebrücke beachten.	35 Tage	Mo 27.03.17	Fr 12.05.17
131	Punktuelle Entfernung der jetzigen DN 300 Stahlgasleitung in der Landrat-Christians-Straße	7 Tage	Mo 15.05.17	Di 23.05.17
132	Rückbau der alten Leitungen aus der zukünftigen Fahrbahn. Knotenpunkt Lüssumer Straße/ Landrat-Christians Straße 94 div. stillgelegte Leitungen ziehen und entfernen.	5 Tage	Fr 21.07.17	Do 27.07.17
133	**Deutsche Telekom Technik**	**293 Tage**	**Mo 05.09.16**	**Mi 18.10.17**
134	Lüsumer Straße gegenüber Hausnummer 5, Kabelverlegung in die neuen Nebenflächen einschl. KZV-Gehäuse verschieben	11 Tage	Mo 05.09.16	Mo 19.09.16
135	Lüssumer Straße / Ecke Fresenbergstraße Kabelverlegung in die neuen Nebenflächen, einschl. durch die Fresenbergstraße	10 Tage	Mo 05.09.16	Fr 16.09.16
136	Lüder-Clüver-Straße/Lüssumer Straße/Landrat-Christian Straße Kabelverlegung in die neuen Nebenflächen des Grundstückes 94/12, einschl. durch die Lüder-Clüver Straße und duch die Landrat-Christian Straße	35 Tage	Mo 05.09.16	Fr 21.10.16
137	Busbahnhof Kabelschacht Nr. 1, Austausch der Kabelschachtabdeckung	2 Tage	Mo 15.05.17	Di 16.05.17
138	Schachtangleichungsarbeiten innerhalb der Arbeitsstelle. Schächte sind nicht mit Radlasten zu überfahren	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
139	**vodafon Kabel Deutschland**	**293 Tage**	**Mo 05.09.16**	**Mi 18.10.17**
140	Kabelverlegung in offener Bauweise von der Geschäftsstelle der AOK Bremen zur Landrat-Christians Straße 94 in den Nebenflächen (parallel mit wesernetz)	40 Tage	Mo 05.09.16	Fr 28.10.16
141	Schachtangleichungsarbeiten innerhalb der Arbeitsstelle	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
142	**EWE**	**293 Tage**	**Mo 05.09.16**	**Mi 18.10.17**
143	Rohr- und Kabelverlegung in die neuen Nebenflächen aus der zukünfigen Fahrbahn im Bereich Lüssumer Straße/Ecke Landrat-Christian Straße. Flurstück 94/12	30 Tage	Mo 05.09.16	Fr 14.10.16
144	Rohrverlegung in den Nebenflächen vom Knotenpunkt Landrat-Christian Straße/Ecke Lüssumer Straße in der Lüssumer Straße bis gegenüber Fresenbergstraße, stadtauswärts	20 Tage	Mo 10.04.17	Fr 05.05.17
145	Kabelverlegung nach Fertigstellung der Rohrverbindung mit Anschlussarbeiten zusammen ca. 1 Woche. Alte Trasse wird dann aufgegeben	6 Tage	Mo 08.05.17	Mo 15.05.17
146	Schachtangleichungsarbeiten innerhalb der Arbeitsstelle	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
147	**ImmoMediaNet**	**156 Tage**	**Mi 15.03.17**	**Mi 18.10.17**
148	Keine Leitungen vorhanden	156 Tage	Mi 15.03.17	Mi 18.10.17
149	**Telekom Deutschland GmbH**	**1 Tag**	**Mi 15.03.17**	**Mi 15.03.17**
150	Öffentliche Telefonzelle verbleibt am Standort Brückenwiderlager.Standortfläche wird nicht verändert	1 Tag	Mi 15.03.17	Mi 15.03.17
151	**Telekom Deutschland GmbH**	**305 Tage**	**Do 31.03.16**	**Mi 31.05.17**
152	Ströer Deutsche Städtemedien führt die Arbeiten aus	305 Tage	Do 31.03.16	Mi 31.05.17
153	**Ströer Deutsche Städtemedien**	**247 Tage**	**Do 31.03.16**	**Fr 10.03.17**
154	Litfaßsäule entfernen. Neuer Standort ist mit Planung ASV abzustimmen	1 Tag	Do 31.03.16	Do 31.03.16
155	Werbetafel auf Flurstück 94/12 einschl. Fundament entfernen. Neuer Standort ist mit der Planung abzustimmen	4 Tage	Mo 01.08.16	Do 04.08.16
156	Werbetafel versetzen Fresenbergstraße. Neuer Standort ist mit den Leitungsträgern und ASV Planung abzustimmen	10 Tage	Mo 15.08.16	Fr 26.08.16
157	Werbetafel CLP 168 in den Nebenflächen vor der AOK entfernen. Neuer Standort ist mit der Planung abzustimmen. Baugenehmigung erforderlich?	5 Tage	Mo 06.03.17	Fr 10.03.17
158	Werbeuhr entfernen	5 Tage	Mo 06.03.17	Fr 10.03.17
159	**Wasser- und Schifffahrtsamt**	**5 Tage**	**Di 28.03.17**	**Mo 03.04.17**
160	Kabelanlage im Bereich der neuen Buswendeanlage aus dem Baumbereich umlegen und bzw. tieferlegen	5 Tage	Di 28.03.17	Mo 03.04.17
161	**BrePark**	**1 Tag**	**Di 14.03.17**	**Di 14.03.17**
162	Parkscheinautomaten entfernen. Fundament entfernt AN des ASV	1 Tag	Di 14.03.17	Di 14.03.17
163	**Telekabel Bremen**	**1 Tag**	**Mi 15.03.17**	**Mi 15.03.17**
164	Keine Leitungen vorhanden	1 Tag	Mi 15.03.17	Mi 15.03.17
165	**LWL-Com**	**1 Tag**	**Mi 15.03.17**	**Mi 15.03.17**
166	Keine Leitungen vorhanden	1 Tag	Mi 15.03.17	Mi 15.03.17
167	**Flurstück 94/12**	**10 Tage**	**Mo 01.08.16**	**Fr 12.08.16**
170	**Umweltbetrieb Bremen**	**1034 Tage**	**Mo 04.01.16**	**Do 19.12.19**
171	Lieferung Substrat	135 Tage	Mo 17.04.17	Fr 20.10.17
172	Vorbereitende Arbeiten	10 Tage	Do 29.06.17	Mi 12.07.17
173	Pflanzarbeiten 1.BA Landrat-Christians-Straße/Lüssumer Straße und Umsteigestelle. 8 Bäume als Containerbäume pflanzen einschl. Oberflächen herstellen	3 Tage	Mi 11.10.17	Fr 13.10.17
174	Pflanzarbeiten 2.BA Landrat-Christians-Straße/Lüssumer Straße. 6 Bäume als Containerbäume pflanzen einschl. Oberflächen herstellen	4 Tage	Di 26.09.17	Fr 29.09.17
175	Pflanzarbeiten 3.BA Bereich zwischen FVE Parkplatz und Umsteigestelle. 5 Bäume als Containerbäume pflanzen einschl. Oberflächen herstellen	5 Tage	Mi 11.10.17	Di 17.10.17
176	Unterhaltung	644 Tage	Mo 03.07.17	Do 19.12.19
177	Projektende	1034 Tage	Mo 04.01.16	Do 19.12.19
